

Kommunedirektørens orientering til plan- og miljøutvalget

21. Januar 2025



SKAUN KOMMUNE
aktiv og attraktiv - sammen

Organisatorisk endring på samfunn og kultur

- Avdeling vei, vann og avløp flyttet fra enhet eiendomsdrift til plan og miljø fra 15. januar 2025
- Tettere samarbeid mellom prosjekt og VA
- Nytt enhetsnavn er plan, miljø og kommunalteknikk
- Frank Johansen leder avdelingen i tillegg til enheten



aktiv og attraktiv
sammen

Status tiltak trafikksikkerhetsplanen

- Vedtak i kommunestyret: *Kommunedirektøren orienter i hvert PMU-møte status på ev. endringer i prioritert tiltaksliste fra vedtatt temaplan trafikksikkerhet 2024-2028*
- Ingen endringer i prioriteringene
- Planlegger trafikksikkerhetstiltak ved Børsa barnehage
- Starter opp utredninger snarvegprosjekt og innfartsparkering Viggja (kost/nytte-vurdering)



aktiv og attraktiv
sammen

Status investeringsprosjekter



SKAUN KOMMUNE
aktiv og attraktiv - sammen

Investeringsprosjekter under arbeid



566 Buvik kirkegård

Dokumentgjennomgang for konkurranseutlysning pågår, lyses ut i januar.


Byggestart:
Ferdigstilles:

Vår 2025
2025



aktiv og attraktiv
sammen

Investeringsprosjekter under arbeid

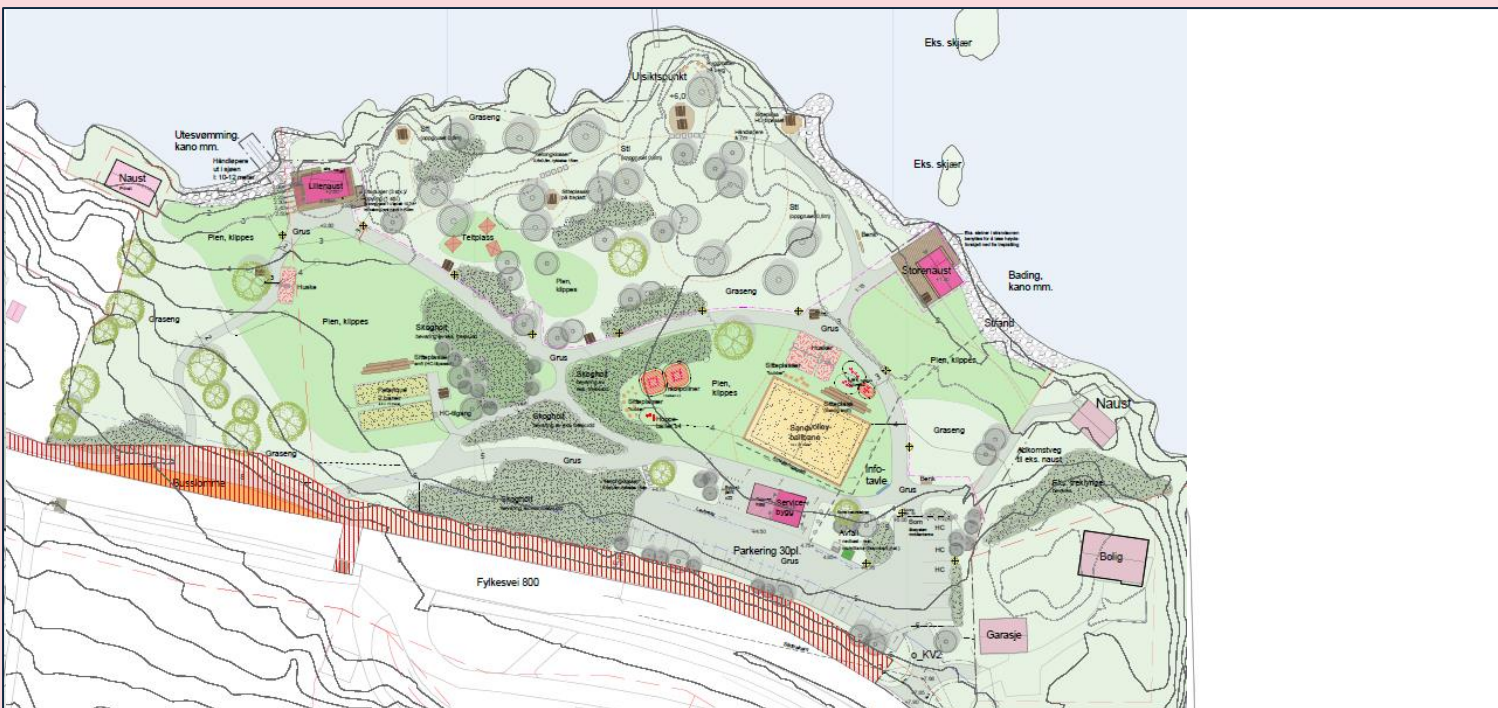

Bygggestart:

Pågå

Ferdigstilles:

2024/25

543 Ølsholmskjæret friluftsområde

Hoveddelen av prosjektet er ferdigstilt og overtatt Beplantning, asfaltering og grusing av gangveier utføres til våren.



aktiv og attraktiv
sammen

Investeringsprosjekter under arbeid



588 Ombygging NAV

Bygging er påstartet, ferdigstilles i mai.

Byggestart:

Des 2024


Ferdigstilles:

Vår 2025



aktiv og attraktiv
sammen

VA-prosjekter under arbeid

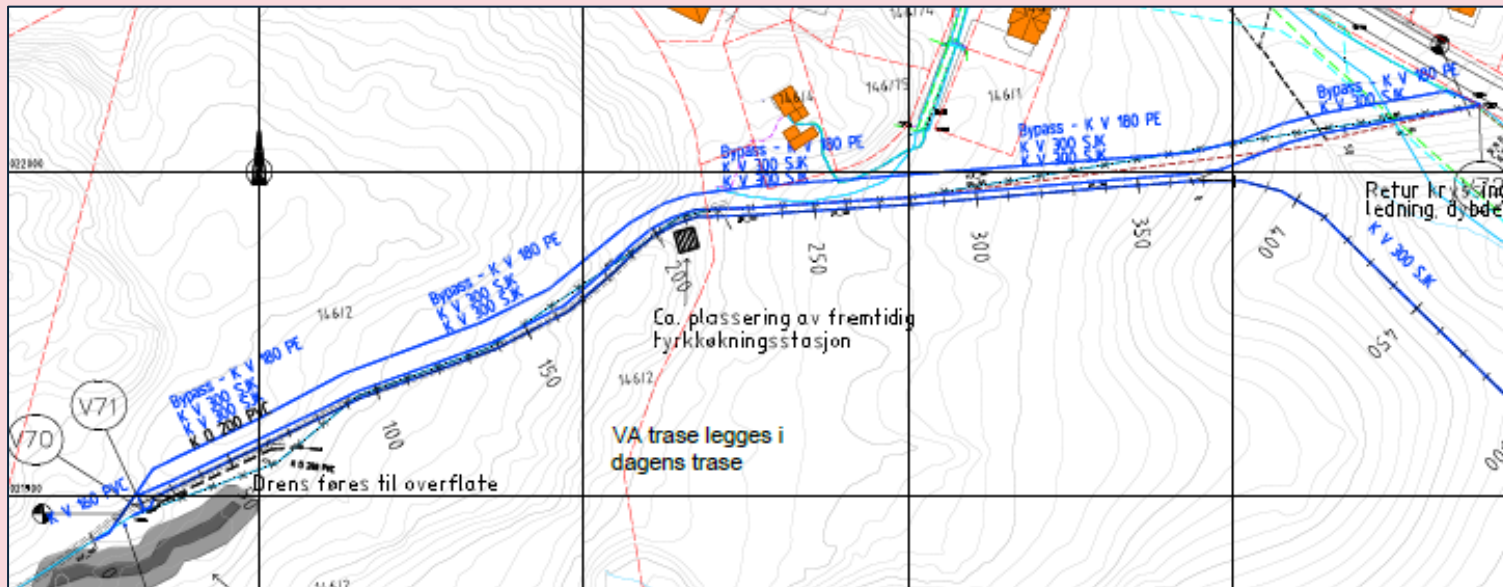

662 Vassåsen høydebasseng

Som et innsparingstiltak undersøkes det hvorvidt Børse-Eggkleiva-ledningen er tilstrekkelig for å dekke behovet for vann for eksisterende bebyggelse i overskuelig fremtid. Beregninger i vannmodellen pågår, forsinket grunnet kapasitet hos kommunens VA-avdeling. Sak om prosjektets framtid fremmes for politisk behandling dersom vannmengden er tilstrekkelig.

Byggestart:


?

Ferdigstilles:



aktiv og attraktiv
sammen

VA-prosjekter under arbeid

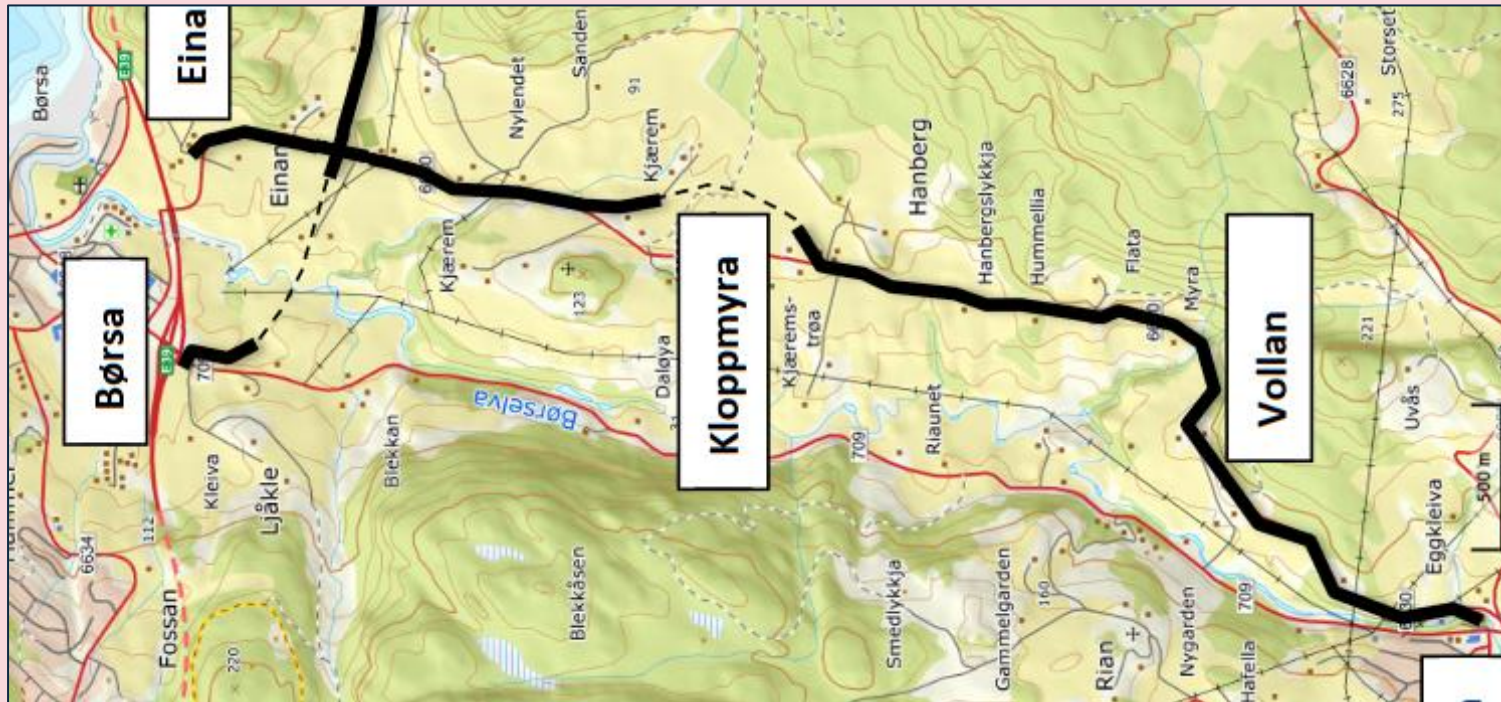

656/754 Eggkleiva - Børsa

Nye ledninger mellom Eggkleiva og Børsa er ferdigstilt og satt i drift. Gammelvegen er gjenåpnet. Sidestrek mot Vassåsen er påstartet, men står på vent grunnet stans i forbindelse med sprenging over E39. Tillatelse til sprenging over tunell er mottatt, planlegging for videreføring av prosjektet pågår.

Byggestart:

Okt 2022


Ferdigstilles:

Høst 2024



aktiv og attraktiv
sammen

VA-prosjekter under arbeid

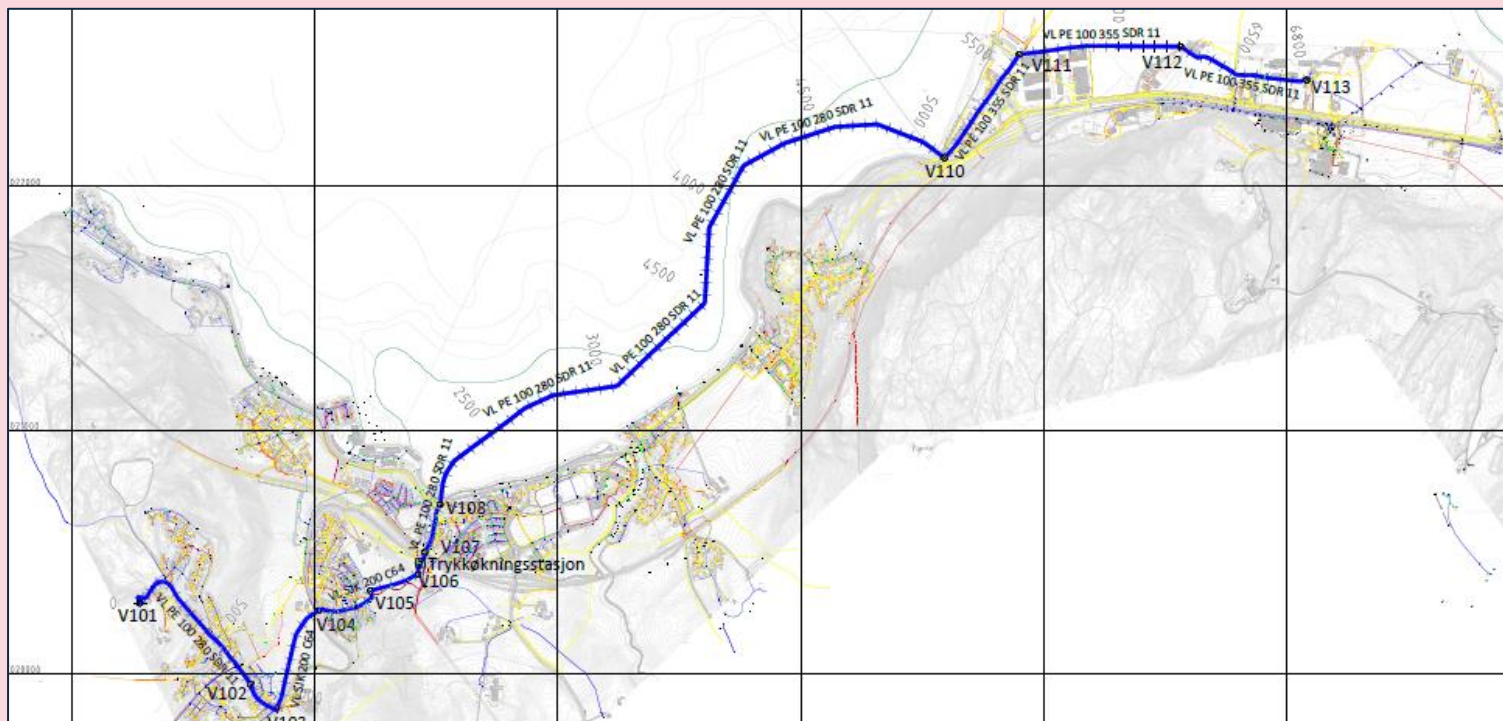

668 Reservevann

Statsforvalteren var ikke enige med prosjektets biologer og krever ny kartlegging av havbunn. Arbeider med landstrekk fortsetter når SF evt gir tillatelse til sjøledning. Nye undersøkelser er gjennomført, arbeid med søknad og trasé basert på disse pågår.

Byggestart: 2025?

Ferdigstilles: 2026?

VA-prosjekter under arbeid



768 VA Børse - Eliløkken

Prosjektet er klart for utlysning, grunneieravtaler gjenstår før entrepriskonkurranse kan lyses ut.


Oppstart: 2024/5?

Ferdigstilles: 2025/6?



aktiv og attraktiv
sammen

VA-prosjekter under arbeid

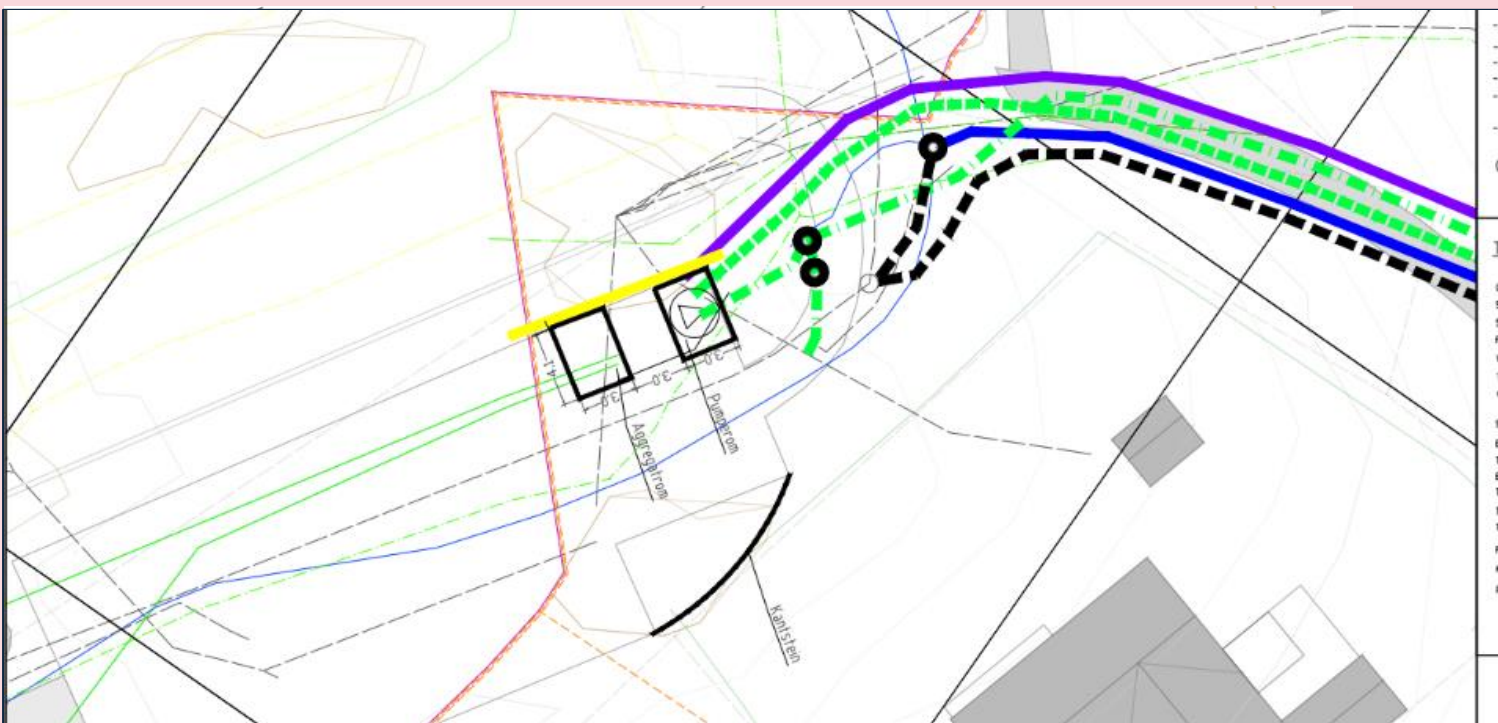

770 VA Børsa sentrum

Arbeidene pågår, ferdigstilles våren 2025. Tett dialog med skolen er etablert mtp trafikkssituasjon og ferdsel i området.

Byggestart:

Høst 2024

Ferdigstilles:

2025



**aktiv og attraktiv
sammen**

VA-prosjekter under arbeid



729 Viggja renseanlegg

Prosjektet ble satt på hold i påvente av avklaring av hvorvidt det skulle bygges med primær- eller sekundærrensing. Dette er nå avklart, nye grunnundersøkelser er gjennomført. Arbeid med utslippssøknad og grunneierkontakt pågår.

Oppstart: 2025

Ferdigstilles: 2025/2026



aktiv og attraktiv
sammen

VA-prosjekter under arbeid

Skifte felleskummer/Utskiftning dårlig ledningsnett

Prosjektplanlegging starter i februar. Begge prosjektene vil starte med en kartlegging/forprosjekt.



aktiv og attraktiv
sammen
